



Prefeitura Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

Ofício nº 80/18 CM

Câmara Municipal de Votorantim
Visto

07 MAR 2018

Bruno Martins de Almeida
Presidente

Votorantim, 06 de Março de 2018.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 055/18, datado em 20 de fevereiro de 2018, através do qual nos encaminha o Requerimento nº 020/18, de autoria do nobre vereador Heber de Almeida Martins, apresentado durante a 3ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, realizada em 20 de fevereiro de 2018, em atenção ao Requerimento formalizado pelo nobre Parlamentar, informamos:

a) A previsão para a conclusão da última barragem é Julho/2018.

b) Não há prejuízos nas questões relacionadas ao Urbanismo visto que as barragens aprovadas pela Cetesb para o Município de Votorantim diferem tecnicamente da citada barragem recentemente concluída em Sorocaba.

No caso de Sorocaba, cuja obra levou aproximadamente 6 anos para a sua conclusão pois teve início em 2012, a barragem foi aprovada com a concepção de utilização de espelho d'água, diferentemente das barragens de Votorantim que foram aprovadas pela Cetesb, porém sem autorização para espelhos d'água, deixando a área de alagamento esvaziada de forma a ficar integrado com a natureza, por estarem localizadas próximos à área de matas.



Prefeitura Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

As obras relacionadas ao projeto de urbanismo existentes no referido contrato somente serão executadas após a conclusão da última barragem, para se evitar que seja danificadas durante a execução das obras.

c) Sim. Segue cópia anexa.

d) Eng.º. Luiz Antonio Messias – CREA nº0600745151 e Eng.º Breno Carneiro Meirelles – CREA 5061447093 da empresa EME – Engenharia e Consultoria Ltda.

e) A empresa responsável pelas obras é a empresa EME – Engenharia e Consultoria Ltda.

f) O valor investido até o momento é de R\$ 7.778.003,52.

g) A obra não encontra-se abandonada. Ocorreu que devido à necessidade de aprovação junto à Caixa Econômica Federal, que é o órgão fiscalizador, da Planilha de Reprogramação visando ajustamento de quantitativos praticados nas obras, a empresa diminuiu o ritmo de trabalho.

Vale salientar que houve uma longa batalha judicial para a desapropriação da área onde está em fase final a obra da última barragem (R1), cuja área foi objeto de adequação no projeto definitivo da barragem R1 cujo desfecho só se deu em final 2016, sendo necessário o protocolo junto à Caixa Econômica Federal da Planilha de Reprogramação, a qual somente foi aprovada em Fevereiro de 2018.

A obra fica condicionada às interrupções dos repasses ocorridos pelo Governo Federal, onde é sabido que mais de 2700 obras encontram-se nas mesmas condições.

No caso da Barragem R1, houve também um imprevisto visto que foi necessária a remoção de uma rede adutora de propriedade da Concessionária Águas de



Prefeitura Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

Votorantim, que somente veio a ser concluída e liberado o local para as obras em meados de Dezembro/2017.

h) A Secretaria responsável pela obra é a Secretaria de Obras e Urbanismo e o Engenheiro Responsável pela Fiscalização das três barragens é o Engenheiro Civil Fábio Luiz Rodrigues.



FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
BRUNO MARTINS DE ALMEIDA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Votorantim/SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO					
Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17 18 11					
ART		1- Nº DA ART			
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77		92221220120839428			
CONTRATADO					
2 - Nº DO CREA DO PROFISSIONAL 0600745151			3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL 59792469834		
4 - NOME DO PROFISSIONAL LUIZ ANTONIO MESSIAS			5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Civil		
ART					
6 - TIPO DE ART 1-Obra/Serviço	7 - VINCULADA A ART Nº		8 - HÁ OUTRAS ARTs VINCULADAS 1 - Não		
9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART 1 - Não		10 - SUBEMPREITADA 1 - Não			
ANOTAÇÃO					
11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO 1 - Responsabilidade Principal		12 - ÁREA DE ATUAÇÃO 5 - Civil, Fortificacao E Construcao		13 - TIPO DE CONTRATADO 1- Pessoa Jurídica	
EMPRESA CONTRATADA					
14 - Nº DE REGISTRO NO CREA 0476167		15 - NOME COMPLETO EME-ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			
16 - CGC/CNPJ 02869192000100		17 - CLASSIFICAÇÃO 1-Empresa Privada			
CONTRATANTE					
18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO Prefeitura Municipal de Votorantim		19 - TELEFONE P/ CONTATO (15)33538640		20 - CPF/CNPJ 46634051000176	
DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO					
21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO Avenida 31 de Marco, 327 - Votorantim				22 - CEP 18110-900	
CLASSIFICAÇÃO					
23 - NATUREZA 1A1315	24 - UNIDADE 15	25 - QUANTIFICAÇÃO 38610,37	26 - ATIVIDADES TÉCNICAS 7 14 25 35 37		
27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO Execucao de projeto e servicos de construcao de barragens e soleiras, incluindo paisagismo, urbanizacao e ciclovias.					
RESUMO DO CONTRATO					
Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC...					
Contrato n. 116/2012 - Execucao de servicos de construcao de barragens para controle de cheias na calha do Corrego Itapeva na Bacia do Pq. Itajai, no valor R\$ 12.339.236,97, com prazo de execucao de obras de 12meses.					
Data de efetiva participação do profissional:01/08/2012					
28 - VALOR DO CONTRATO 12.339.236,97	29 - DATA DO CONTRATO 12/07/2012	30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO 01/08/2012	31 - 10% ENTIDADE DE CLASSE 68	32 - VALOR DA ART A PAGAR 150,00	
ASSINATURA					
Declaro ser de minha responsabilidade técnica, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº.5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.					
33 - LOCAL E DATA Votorantim 31/07/2012		PROFISSIONAL Luiz Antonio Messias		CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Votorantim	

Obs:

- O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
- Linha digitável:



BOLETIM DE MEDIÇÃO II

Grau de Sigilo
#00

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) 116/2012		BM - número 31	BM - Data emissão 29/11/2017	BM - Período de referência da medição de 01/07/2017 a 31/10/2017	Nº do CT 0351028-34/2011	Data do CT 26/08/2011
Início da obra - data 13/08/2012	Previsão Término obra 12/08/2013	Empresa Contratada EME ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.			CNPJ 02.869.192/0001-00	
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 12.339.236,97		CTEF - dt assinatura 12/07/2012			Objeto do CTEF (resumido) CONSTR. DE BARRAGENS PARA CONTR. DE CHEIAS NA CALHA DO CÓRREGO ITAPEVA - PAC 2	
CTEF- Valor total atual (R\$)		CTEF- dt último Adit.			Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO PARQUE JATAÍ - VOTORANTIM - SP	
					Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	
					Agente Operador - Repasse MINISTÉRIO DAS CIDADES	
					Fonte de Recursos <input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou outra (descrever):	

Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsto no Orçamento				Executado Físico			Executado Financeiro (R\$)			Acum (%)
	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Acum até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	
SUBTOTAIS				20.142,75				3.357,13	-	3.357,13	0,17
BDI	%			-				-	-	-	-
TOTAL				20.142,75				3.357,13	-	3.357,13	0,17
4.	TOTAIS			734.179,83			-	115.977,83	-	115.977,83	0,16
TOTAL OBRAS				9.952.823,62			0,01	7.778.003,52	691.649,28	8.469.652,81	0,85
Trabalho socioambiental				109.192,00				-	-	-	-
Saldo a reprogramar				747.984,38							
TOTAIS				10.810.000,00			0,01	7.778.003,52	691.649,28	8.469.652,81	0,78

Observações

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Responsável - Tomador

Nome:

Cargo:

Área:

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviços

Nome:

Profissão::

CREA Nº



LEGENDA

- PROJETO BÁSICO - 20.600 m²
- PROJETO EXECUTIVO - 29.368 m²

OBRA:
Estruturas de contenções de cheias - R1

ÁREAS DE ALAGAMENTO NA MÁXIMA

DESENHO:
SOBREPOSIÇÃO DO PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO

LOCAL:
VOTORANTIM / SP

FOLHA:

01

DATA:
12/2015

REVISÃO:
R1

ESCALA:
SEM ESCALA


01



LEGENDA

- PROJETO BÁSICO - 27.120 m²
- PROJETO EXECUTIVO - 12.583 m²

OBRA:			Estruturas de contenções de cheias - R3
ÁREAS DE ALAGAMENTO NA MÁXIMA			
DESENHO:			SOBREPOSIÇÃO DO PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO
LOCAL:			VOTORANTIM / SP
DATA:	REVISÃO:	ESCALA:	FOLHA: 01 01
12/2015	R1	SEM ESCALA	

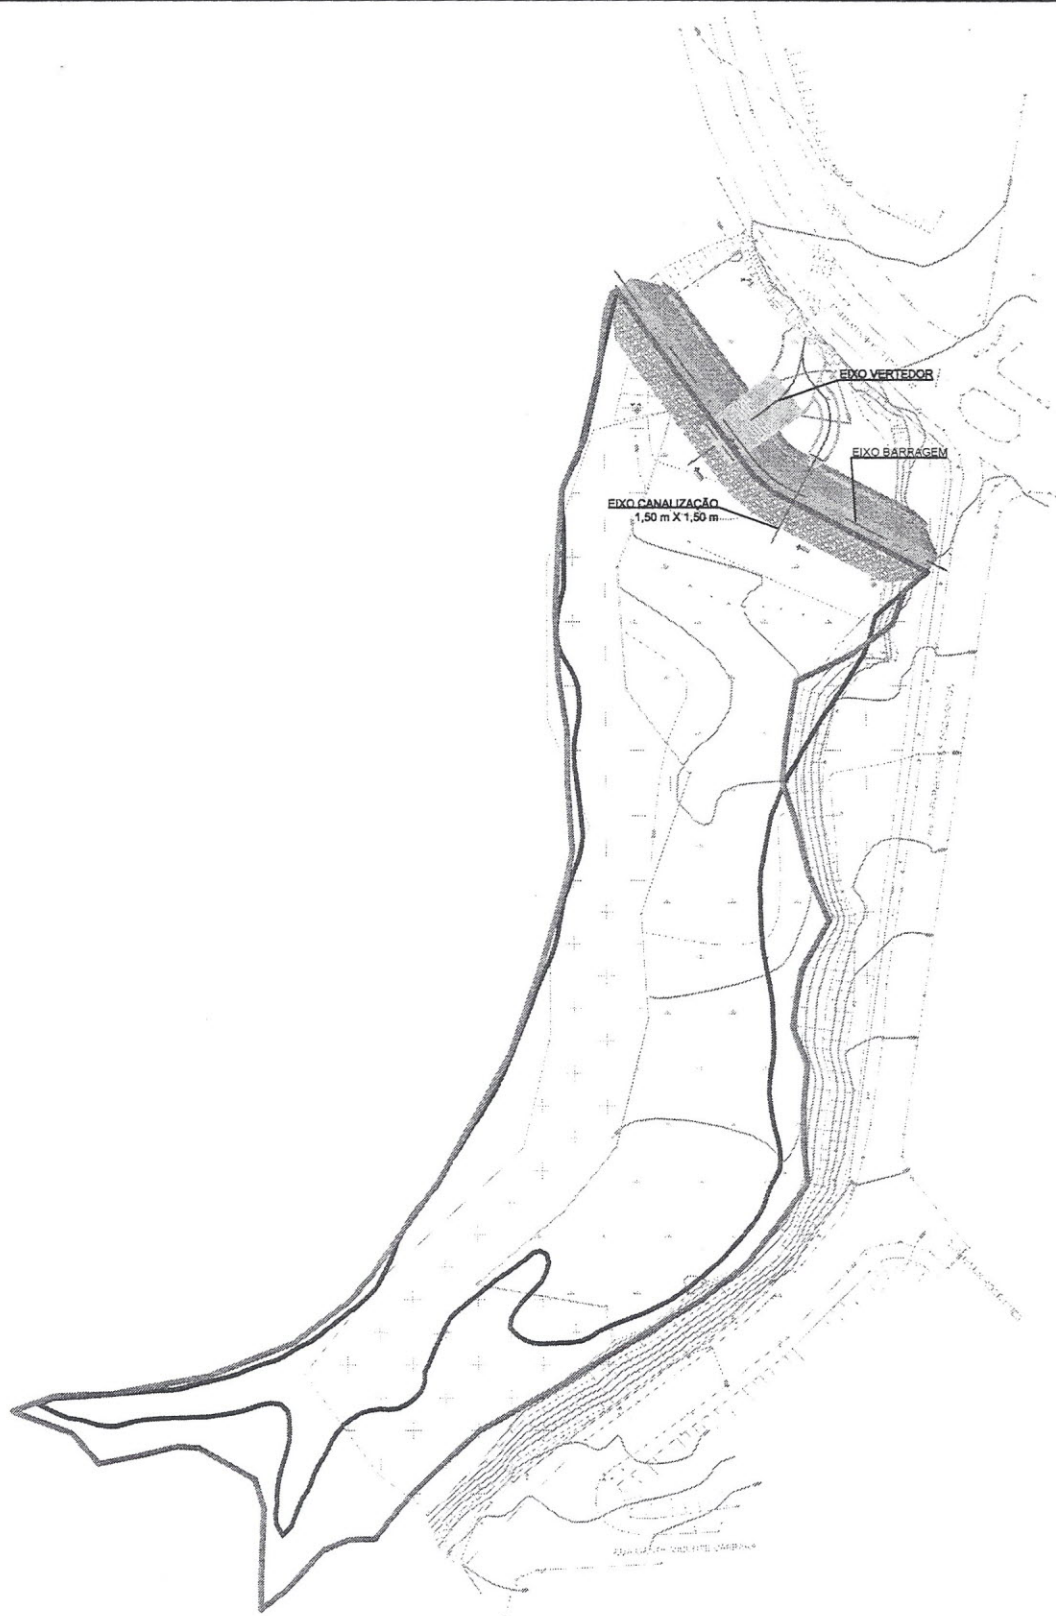

LEGENDA

- PROJETO BÁSICO - 25.400 m²
- PROJETO EXECUTIVO - 31.431 m²

OBRA: Estruturas de contenções de cheias - R2		
ÁREAS DE ALAGAMENTO NA MÁXIMA		
DESENHO: SOBREPOSIÇÃO DO PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO		
LOCAL: VOTORANTIM / SP		FOLHA: 01
DATA: 12/2015	REVISÃO: R1	ESCALA: SEM ESCALA
